



Regione Emilia-Romagna

SISMA E RICOSTRUZIONE

2012-2016

4

Commissione III^a Territorio, Ambiente, Mobilità

21 Aprile 2016

**IL PUNTO SULLA
RICOSTRUZIONE D'EMILIA**






Regione Emilia-Romagna

SISMA E RICOSTRUZIONE

2012-2016 **4**

INDICE ARGOMENTI:

- Criteri per la Rimodulazione dei Comuni e riduzione del cratere
- La Ricostruzione Privata
- Le Zone Franche Urbane
- La Ricostruzione pubblica
- Le Donazioni
- Agenda & Scadenziario
- L'Agenzia per la Ricostruzione
- Formazione & Informazione





2012

LA STRUTTURA COMMISSARIALE IL COMITATO ISTITUZIONALE



2016



emergenza



ricostruzione





Individuazione di un nuovo perimetro ai fini della gestione delle misure e degli interventi necessari per completare la **ricostruzione privata**



25/60 Comuni hanno di fatto completato l'istruttoria «privata» (Abitazioni+Imprese)

8 Comuni 1^ Fascia
15 Comuni 2^ Fascia
12 Comuni 3^ Fascia

«Un doveroso segnale di responsabilità e attenzione sia verso il Paese che guarda al <modello emiliano>, sia verso quei Comuni che ad oggi sono ancora fortemente impegnati sul fronte della Ricostruzione»

LA RICOSTRUZIONE PRIVATA

	SFINGE	MUDE	INAIL	TOTALI
DOMANDE ATTIVE	2924	8.464	922	12.310
DECRETI CONCESSIONE	1911	6.637	815	9.363
EURO CONCESSI	1.080.220.013	1.664.454.119	27.879.354	2.772.553.486
DECRETI LIQUIDAZIONE	1674	--	698	
EURO LIQUIDATI	468.172.530	951.016.236	21.215.355	1.440.404.121
LIQUIDATO/CONCESSO (in Euro)	43,3%	57,1%	76,0%	52%
N. CONCESSIONI/ DOMANDE ATTIVE	65,3%	78,4%	88,4%	76%

TOTALE CONCESSO
2.772.553.486

TOTALE LIQUIDATO
1.440.404.121

DETTAGLIO MUDE (31.03.2016)

	Domande in lavorazione presso i comuni (al netto delle 707 cd. "abbandonate")	di cui ordinanze di concessione di contributo	TOT contributi concessi (mln)	TOT Contributi erogati (mln)	Erogato/ Concesso
B-C	3.534	3.416	€ 223.385.125	€ 192.613.063	86%
E leggere	820	694	€ 194.493.074	€ 142.935.425	73%
E pesanti	4.110	2.527	€ 1.246.575.920	€ 615.467.748	49%
Totale	8.464	6.637	€ 1.664.454.119	€ 951.016.236	57%

***Attività economiche*: 6.333** (unità ad uso produttivo, deposito, commercio, ufficio)
 *(Attività i cui danni all'Immobile sono stati presentati su Mude poiché svolte in edifici residenziali o misti)



8.484 DOMANDE ATTIVE, PARI A:

- 18,048 ABITAZIONI
- 6.333 ATT. ECONOMICHE
- 28.701 ABITANTI

DI CUI:

4.069 CANTIERI CONCLUSI

61.3 % domande concesse



12.977 Unità abitative

18.490 Abitanti

pari a:

SFINGE Bandi Inail (01/04/2016)

Ordinanze 23/2013 - 52/2013 - 91/2013 e smi



NOVITA' BANDO INAIL

- Domande entro 30/6
- OK anche aziende senza dipendenti
- Anche 2^a domanda per Migl. nto Sismico
- Lavori entro 31.12.2017
- Rendicontazione entro 30.06.2018

DOMANDE

ATTIVE

N°

922

IMPORTO

54.969.571

CONCESSIONI

DECRETI

N°

815

IMPORTO CONTRIBUTO

27.879.354

LIQUIDAZIONE

DECRETI

N°

698

IMPORTO LIQUIDATO

21.215.355

PRENOTAZIONI INAIL

Riparto per Settore



INDUSTRIA

COMMERCIO

AGRICOLTURA

TOTALE

878

596

573

2047

248.918.395,77

142.066.065,12

113.646.052,70

504.630.513,59

PRENOTAZIONI SFINGE ord 57/2012

Riparto per soggetto presentatore

01/04/2016 - PRENOTAZIONI NON ANCORA PRESENTATE

		INDUSTRIA	AGRICOLT	COMM-TUR	
ISTANZE PRELIMINARI CONFERMATE NON PRESENTATE	N°	579	325	182	1086
	IMPORTO	521.763.075	192.626.857	142.272.169	856.662.100



BENEFICI FISCALI ALLE P.MI.

NEI CENTRI STORICI DI 20 COMUNI

39,2 Milioni di Euro

Totale Risorse 2015/2016

BANDO CHIUSO 31/3/2016:

1.770 DOMANDE

22.147 Euro

Media Agevolazione concedibile

**Sotto forma di
esenzioni fiscali su:**

- Imposte Redditi
- IRAP
- Imposta Municipale propria



62% Imprese Ind.

34% Società

Comuni	Imprese
Bastiglia	27
Bomporto	67
Camposanto	25
Carpi (*)	132
Cavezzo	91
Concordia sulla Secchia	79
Finale Emilia	193
Medolla	71
Mirandola	278
Modena (**)	2
Novi di Modena	77
S. Possidonio	47
San Felice sul Panaro	89
San Prospero	24
Cento (*)	247
Mirabello	28
Poggio Renatico	46
Sant'Agostino	48
Reggiolo	81
Crevalcore	118
Totale 20 Comuni	1770

(*) nel limite del 10% delle risorse

(**) solo frazioni Rocca, S. Matteo, Navicello e Albareto

RISORSE NECESSARIE INIZIALI

€ 1.773.721.979,95

RISORSE NECESSARIE

€ 1.663.854.809,59

INTERVENTI FINANZIATI

€ 1.059.418.089,05 – 63,67%

PROGETTI PRESENTATI

€ 885.937.112,04 – 53,25%

RISORSE ASSEGNATE

€ 510.458.515,33 – 30,68%



Programma Opere Pubbliche, Beni Culturali, Edilizia Scolastica ed Università

TOTALE N. INTERVENTI

2.039

STIMA DEI DANNI

1.664 MLN

N. INTERVENTI FINANZIATI

875 di cui

789 Progetti Presentati (509 MLN)

388 Progetti Autorizzati (134 MLN)

RISORSE DISPONIBILI

932 MLN

Fondi del Commissario 555 MLN

Co-finanziamenti: 377 MLN

NEW

LEGGE DI STABILITA' 2016:

BENI CULTURALI

+127 MLN


*(*risorse aggiuntive)*





- 58% Enti Locali
- 32% Enti Religiosi
- 8% altri Enti
- 2% ACER

Stato di attuazione per tipologie di interventi

TIPOLOGIA INTERVENTI	TOTALE INTERVENTI FINANZIATI	%	PROGETTI PRESENTATI TOTALI	%	TOTALE RISORSE ASSEGNATE	%
CHIESE	€ 231.434.050,51	21,85%	€ 184.778.703,20	20,86%	€ 76.447.495,40	14,96%
BBCC	€ 387.541.133,45	36,58%	€ 287.440.412,34	32,44%	€ 165.872.859,64	32,46%
OOPP	€ 180.701.945,73	17,06%	€ 177.441.123,66	20,03%	€ 111.667.694,67	21,85%
SCUOLE	€ 259.740.959,55	24,51%	€ 236.276.872,84	26,67%	€ 157.000.755,08	30,72%
GENERALE	€ 1.059.418.089,24	100,00%	€ 885.937.112,04	100,00%	€ 510.988.804,79	100,00%

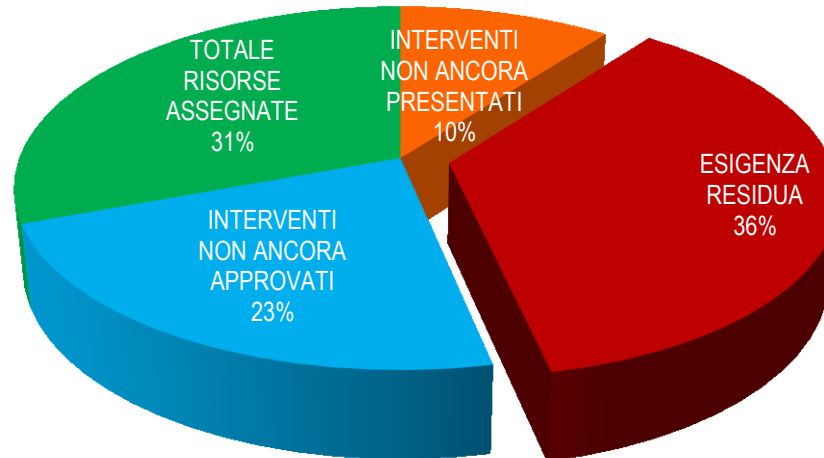

Stato del finanziamento ai soggetti attuatori

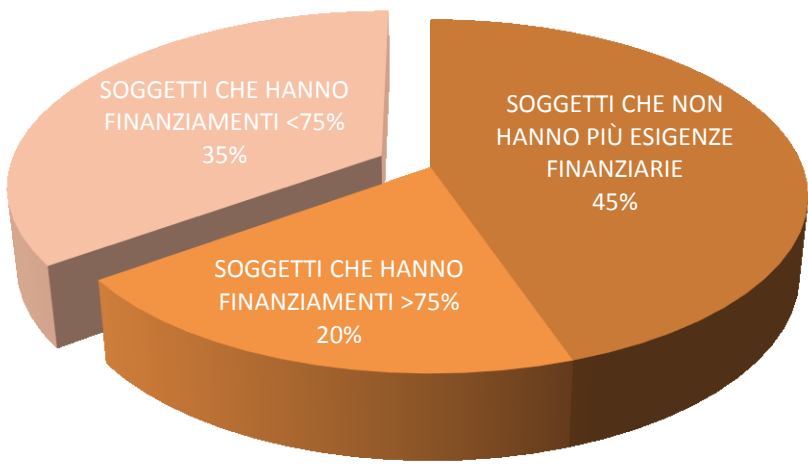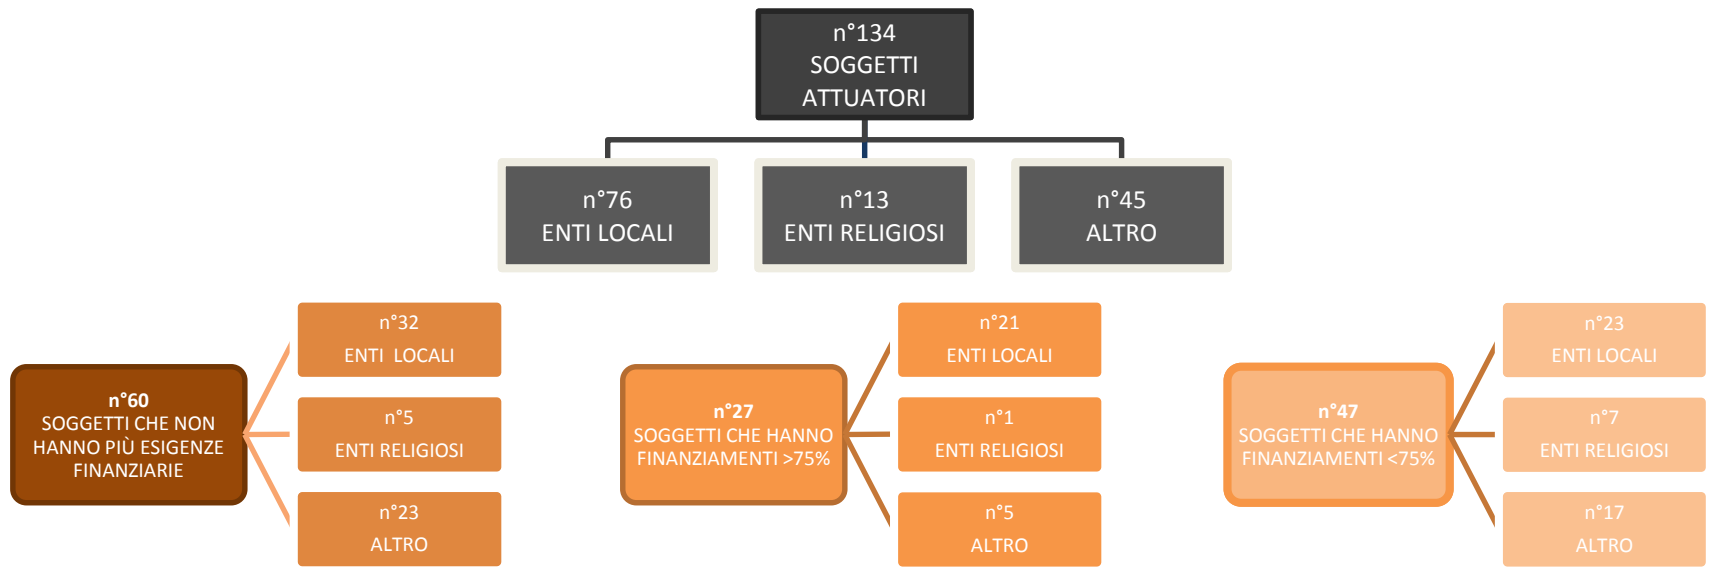

n°60 (N°29 COMUNI)

SOGGETTI ATTUATORI CHE HANNO OTTENUTO COPERTURA FINANZIARIA COMPLETA

SOGGETTO ATTUATORE	STIMA RISORSE NECESSARIE	TOTALE INTERVENTI FINANZIATI	%
ASP Area Nord	€ 2.929.439,22	€ 2.929.439,22	100,00%
ASP Azienda Servizi alla Persona dell'Unione Terre d'Argine	€ 5.079.889,15	€ 5.079.889,15	100,00%
ASP Irides	€ 70.245,00	€ 70.245,00	100,00%
ASP PROGETTO PERSONA	€ 3.933.430,00	€ 3.933.430,00	100,00%
Associazione Asilo Infantile "Ing. A. Giordani"	€ 63.542,69	€ 63.542,69	100,00%
AUSL di Reggio Emilia	€ 218.700,00	€ 218.700,00	100,00%
Azienda Ospedaliera - Univ. di Reggio Emilia	€ 198.000,00	€ 198.000,00	100,00%
CISA centro integrato servizio anziani	€ 250.000,00	€ 250.000,00	100,00%
Commissario Delegato	€ 25.669.853,23	€ 25.669.853,23	100,00%
Comune di Argelato (BO)	€ 1.421.808,02	€ 1.421.808,02	100,00%
Comune di Argenta (FE)	€ 1.561.318,00	€ 1.561.318,00	100,00%
Comune di Baricella (BO)	€ 475.000,00	€ 475.000,00	100,00%
Comune di Bastiglia (MO)	€ 1.324.260,13	€ 1.324.260,13	100,00%
Comune di Bentivoglio (BO)	€ 2.763.486,03	€ 2.763.486,03	100,00%
Comune di Boretto (RE)	€ 225.587,40	€ 225.587,40	100,00%
Comune di Brescello (RE)	€ 250.000,00	€ 250.000,00	100,00%
Comune di Campagnola Emilia (RE)	€ 291.061,20	€ 291.061,20	100,00%
Comune di Campogalliano (MO)	€ 658.088,53	€ 658.088,53	100,00%
Comune di Camposanto (MO)	€ 1.704.912,12	€ 1.704.912,12	100,00%
Comune di Castel Maggiore (BO)	€ 204.522,38	€ 204.522,38	100,00%
Comune di Correggio (RE)	€ 5.367.031,81	€ 5.367.031,81	100,00%
Comune di Fabbrico (RE)	€ 3.036.457,77	€ 3.036.457,77	100,00%
Comune di Gualtieri (RE)	€ 1.550.712,69	€ 1.550.712,69	100,00%
Comune di Imola (BO)	€ 250.000,00	€ 250.000,00	100,00%
Comune di Luzzara (RE)	€ 2.820.500,00	€ 2.820.500,00	100,00%
Comune di Malalbergo (BO)	€ 168.464,36	€ 168.464,36	100,00%
Comune di Minerbio (BO)	€ 1.701.275,20	€ 1.701.275,20	100,00%
Comune di Mirabello (FE)	€ 2.512.929,11	€ 2.512.929,11	100,00%
Comune di Molinella (BO)	€ 311.715,60	€ 311.715,60	100,00%
Comune di Novellara (RE)	€ 2.633.750,00	€ 2.633.750,00	100,00%
Comune di Poggio Renatico (FE)	€ 10.367.335,24	€ 10.367.335,24	100,00%

SOGGETTO ATTUATORE	STIMA RISORSE NECESSARIE	TOTALE INTERVENTI FINANZIATI	%
Comune di Ravarino (MO)	€ 215.455,16	€ 215.455,16	100,00%
Comune di Rio Saliceto (RE)	€ 484.949,51	€ 484.949,51	100,00%
Comune di Sala Bolognese (BO)	€ 667.142,24	€ 667.142,24	100,00%
Comune di San Giorgio di Piano (BO)	€ 393.785,00	€ 393.785,00	100,00%
Comune di San Martino in Rio (RE)	€ 1.324.375,00	€ 1.324.375,00	100,00%
Comune di San Pietro in Casale (BO)	€ 1.880.462,88	€ 1.880.462,88	100,00%
Comune di San Possidonio (MO)	€ 6.938.941,79	€ 6.938.941,79	100,00%
Comunità ebraica	€ 1.776.960,00	€ 1.776.960,00	100,00%
Conservatorio di Musica G. Frescobaldi	€ 260.000,00	€ 260.000,00	100,00%
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA)	€ 368.375,00	€ 368.375,00	100,00%
Fondazione Patrimonio degli Studi	€ 725.000,00	€ 725.000,00	100,00%
Fondazione Santa Maria di Corporeno	€ 637.500,00	€ 637.500,00	100,00%
Istituto delle Orsoline (F.M.I.)	€ 550.000,00	€ 550.000,00	100,00%
ONLUS "Campi d'Arte"	€ 65.000,00	€ 65.000,00	100,00%
Opera Pia Storchi	€ 62.500,00	€ 62.500,00	100,00%
Parrocchia della Beata Vergine delle Grazie	€ 200.000,00	€ 200.000,00	100,00%
Parrocchia di Santa Maria Assunta (RE)	€ 49.979,21	€ 49.979,21	100,00%
Parrocchia di Santa Maria Nascente (e San Genesio)	€ 200.000,00	€ 200.000,00	100,00%
Partecipanza Agraria	€ 686.272,71	€ 686.272,71	100,00%
Patronato Figli del Popolo	€ 250.000,00	€ 250.000,00	100,00%
Provincia di Modena	€ 25.856.332,50	€ 25.856.332,50	100,00%
Provincia di Reggio Emilia	€ 770.150,00	€ 770.150,00	100,00%
R.E.R. - CdB di Secondo Grado per il canale Emiliano Romagnolo	€ 85.000,00	€ 85.000,00	100,00%
R.E.R. - Consorzio di Bonifica Renana	€ 445.488,05	€ 445.488,05	100,00%
R.E.R. Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	100,00%
S.F.L. di Bologna	€ 175.000,00	€ 175.000,00	100,00%
S.F.L. Fondazione Autonoma di Culto Santa Maria delle Grazie	€ 718.750,00	€ 718.750,00	100,00%
Università degli Studi di Bologna	€ 8.873.336,05	€ 8.873.336,05	100,00%
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	€ 6.482.381,90	€ 6.482.381,90	100,00%
	€ 142.656.451,88	€ 142.656.451,88	

FOCUS: Chiese e Luoghi di Culto

	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO PIANO	IMPORTO NEW PIANO	IMPORTO CO-FINANZIAMENTI	IMPORTO ASSEGNATI DA PIANO	IMPORTO TOTALE ASSEGNATO	N. INTERVENTI CONCLUSI	IMPORTO INTERVENTI CONCLUSI
ARCIDIOCESI DI BOLOGNA	€ 61.155.262,28	€ 32.770.733,21	€ 9.029.065,43	€ 19.355.463,64	€ 14.732.700,04	€ 34.088.163,68	7	€ 518.389,72
ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA	€ 51.400.155,87	€ 38.033.400,51	€ 9.308.619,71	€ 4.058.135,65	€ 4.298.442,58	€ 8.356.578,23	4	€ 1.827.087,58
ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO	€ 27.765.398,23	€ 20.574.483,91	€ 4.727.996,13	€ 2.462.918,19	€ 1.075.668,49	€ 3.538.586,68	1	€ 5.445,00
ARCIDIOCESI DI RAVENNA-CERVIA	€ 1.232.271,72	€ 321.629,18	€ 471.069,18	€ 439.573,36	€ 313.857,30	€ 753.430,66	0	€ 0,00
DIOCESI DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA	€ 16.212.627,61	€ 10.807.291,60	€ 3.310.336,01	€ 2.095.000,00	€ 1.909.727,48	€ 4.004.727,48	1	€ 30.399,89
DIOCESI DI CARPI	€ 46.509.949,08	€ 28.788.740,02	€ 12.275.540,61	€ 5.445.668,45	€ 8.784.424,61	€ 14.230.093,06	0	€ 0,00
ALTRI ENTI	€ 27.158.385,72	€ 22.232.667,41		€ 4.925.718,31	€ 6.550.197,30	€ 11.475.915,61	0	€ 0,00
GENERALE	€ 231.434.050,51	€ 153.528.945,84	€ 39.122.627,07	€ 38.782.477,60	€ 37.665.017,80	€ 76.447.495,40	13	€ 2.381.322,19



INTERVENTI CONCLUSI: 13
PARI A EURO: 2.381.322

FOCUS: Edilizia Scolastica ed Università

1. Le Riparazioni

	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO PIANO	IMPORTO CO-FINANZIAMENTI	IMPORTO ASSEGNATI DA PIANO	IMPORTO TOTALE ASSEGNATO	N. INTERVENTI CONCLUSI	IMPORTO INTERVENTI CONCLUSI
PROVINCIA DI BOLOGNA	€ 28.106.484,90	€ 11.501.447,61	€ 16.605.037,29	€ 2.582.846,67	€ 19.187.883,96	11	€ 469.578,67
PROVINCIA DI FERRARA	€ 98.929.913,74	€ 39.012.169,07	€ 59.917.744,67	€ 2.024.217,69	€ 61.941.962,36	0	€ 0,00
PROVINCIA DI MODENA	€ 110.003.360,21	€ 57.184.949,83	€ 52.818.410,38	€ 12.157.393,68	€ 64.975.804,06	0	€ 0,00
PROVINCIA DI REGGIO-EMILIA	€ 22.701.200,70	€ 14.931.001,49	€ 7.770.199,21	€ 3.124.905,49	€ 10.895.104,70	3	€ 40.802,08
GENERALE	€ 259.740.959,55	€ 122.629.568,00	€ 137.111.391,55	€ 19.889.363,53	€ 157.000.755,08	14	€ 510.380,75



© Can Stock Photo - csp4552505

INTERVENTI CONCLUSI: 14
PARI A EURO: 510.380

FOCUS: Edilizia Scolastica ed Università

2. Le Nuove Costruzioni



COMPLETE:

37 Edifici Temporanei (EST)


32 Prefabbricati Modulari(PMS)

27 Palestre

6 Aule Magne + Laboratori

98.500 MQ totali realizzati

18.500 studenti

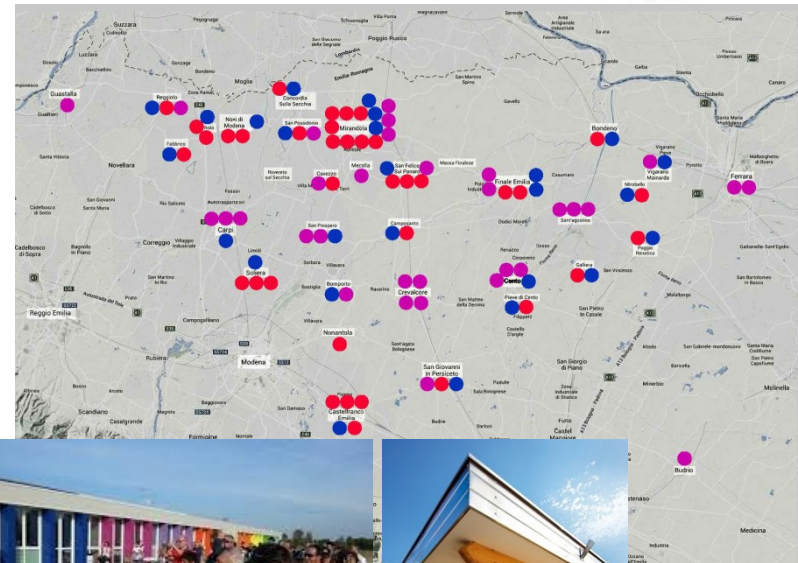

102

INTERVENTI

160,9

ML Euro

18.500 STUDENTI

FOCUS: Opere Pubbliche

	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO PIANO	IMPORTO CO-FINANZIAMENTI	IMPORTO ASSEGNATI DA PIANO	IMPORTO TOTALE ASSEGNATO	N. INTERVENTI CONCLUSI	IMPORTO INTERVENTI CONCLUSI
PROVINCIA DI BOLOGNA	€ 11.280.585,51	€ 1.799.149,02	€ 9.481.436,49	€ 563.016,98	€ 10.044.453,47	6	€ 121.516,75
PROVINCIA DI FERRARA	€ 29.305.473,89	€ 12.268.483,38	€ 17.036.990,51	€ 4.831.511,11	€ 21.868.501,62	4	€ 101.724,23
PROVINCIA DI MODENA	€ 128.982.355,74	€ 78.072.514,99	€ 50.909.840,75	€ 18.273.417,43	€ 69.183.258,18	18	€ 798.866,58
PROVINCIA DI REGGIO-EMILIA	€ 9.523.530,59	€ 4.096.360,60	€ 5.427.169,99	€ 3.589.311,41	€ 9.016.481,40	1	€ 17.240,37
PROVINCIA DI MANTOVA	€ 1.610.000,00	€ 585.000,00	€ 1.025.000,00	€ 530.000,00	€ 1.555.000,00	1	€ 7.368,80
GENERALE	€ 180.701.945,73	€ 96.821.507,99	€ 83.880.437,74	€ 27.787.256,93	€ 111.667.694,67	30	€ 1.046.716,73

ALTRI EDIFICI RICOSTRUITI:

- 9 Municipi
- 7 Magazzini comunali
- 3 Caserme Carabinieri
- 2 Biblioteche
- 1 Sede Pubblica Assistenza
- 1 Sede Prot. Civile - Croce Rossa - Vigili Fuoco
- 1 Centro Unificato Emergenze CUE

INTERVENTI CONCLUSI: 30
PARI A EURO: 1.046.716



24	24,600	50.800.000
EDIFICI	Mq	EURO

FOCUS: Beni Culturali

	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO PIANO	IMPORTO NEW PIANO	IMPORTO CO-FINANZIAMENTI	IMPORTO ASSEGNATI DA PIANO	IMPORTO TOTALE ASSEGNATO	N. INTERVENTI CONCLUSI	IMPORTO INTERVENTI CONCLUSI
PROVINCIA DI BOLOGNA	€ 53.657.319,20	€ 25.170.977,85		€ 28.486.341,35	€ 5.577.166,49	€ 34.063.507,84	2	€ 330.760,90
PROVINCIA DI FERRARA	€ 100.038.629,86	€ 56.986.051,37		€ 43.052.578,49	€ 15.086.637,36	€ 58.139.215,85	1	€ 35.061,30
PROVINCIA DI MODENA	€ 108.476.158,99	€ 70.857.800,71		€ 37.618.358,28	€ 12.554.105,91	€ 50.172.464,19	3	€ 46.835,73
PROVINCIA DI REGGIO-EMILIA	€ 24.497.925,25	€ 16.344.519,99		€ 8.153.405,26	€ 3.282.904,88	€ 11.436.310,14	1	€ 24.689,11
PROVINCIA DI MANTOVA	€ 12.674.670,49	€ 12.590.000,00		€ 84.670,49	€ 11.976.691,13	€ 12.061.361,62	0	€ 0,00
GENERALE	€ 299.344.703,79	€ 181.949.349,92	€ 88.196.429,66*	€ 117.395.353,87	€ 48.477.505,77	€ 165.872.859,64	7	€ 437.347,04
	+ € 88.196.429,66*	← * NON ANCORA DEFINITI						
	€ 387.541.133,45							



INTERVENTI CONCLUSI: 7
PARI A EURO: 437.347

MISURE DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

FORMA DI ASSISTENZA	Nuclei assistiti alla data del sisma	Nuclei assistiti a marzo/aprile 2016	Diminuzione nuclei assistiti %
Contributo canone di locazione - CCL	15.000 (ex CAS)	1486	- 81,99%
Contributo disagio abitativo - CDA		1216	
PMAR - prefabbricati abitativi urbani	757	150	- 80,18%
PMRR - prefabbricati abitativi rurali	240	206	- 14,17%
Alloggi in locazione temporanea	550	289	- 47,45%
TOTALE	16.547	3.347	- 79,77%

Dettaglio «MAP»

PMAR 2012	PMAR OGGI	CALO %
757	150	-80%



Cento	12
Cavezzo	13
Concordia	11
Mirandola	34
Novi di M.	42
San Felice P.	24
San Possidonio	14
Totale PMAR	150

NUCLEI ASSISTITI 6/2012

16.547

NUCLEI ASSISTITI 4/2016


3.347

- 79,7%

LE DONAZIONI

76 Progetti per Euro 33.596.541

Valore totale progetti

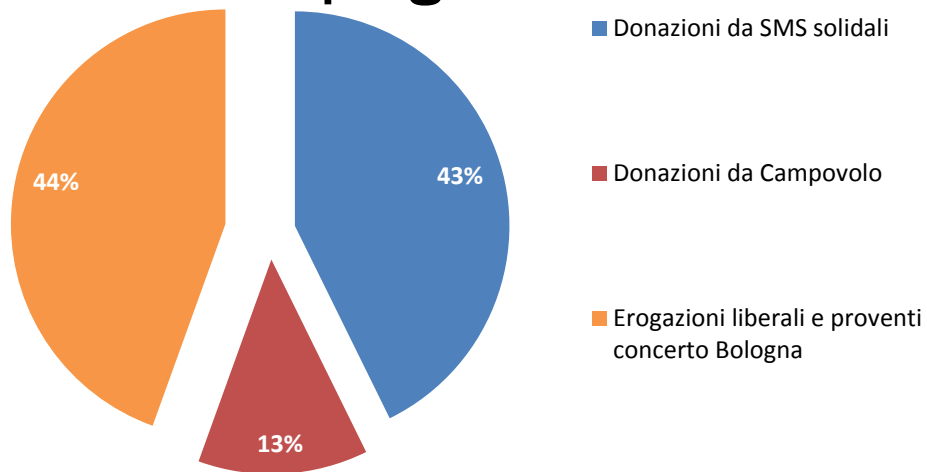

Reggio E. >150,000 presenti




Valore totale progetti	EURO
Donazioni da SMS solidali	14.350.000,00
Donazioni da concerto Campovolo	4.300.000,00
Erogazioni liberali e proventi concerto Bologna	14.946.541,32
TOTALE:	33.596.541,32



Bologna >30,000 biglietti

LE DONAZIONI

PER STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

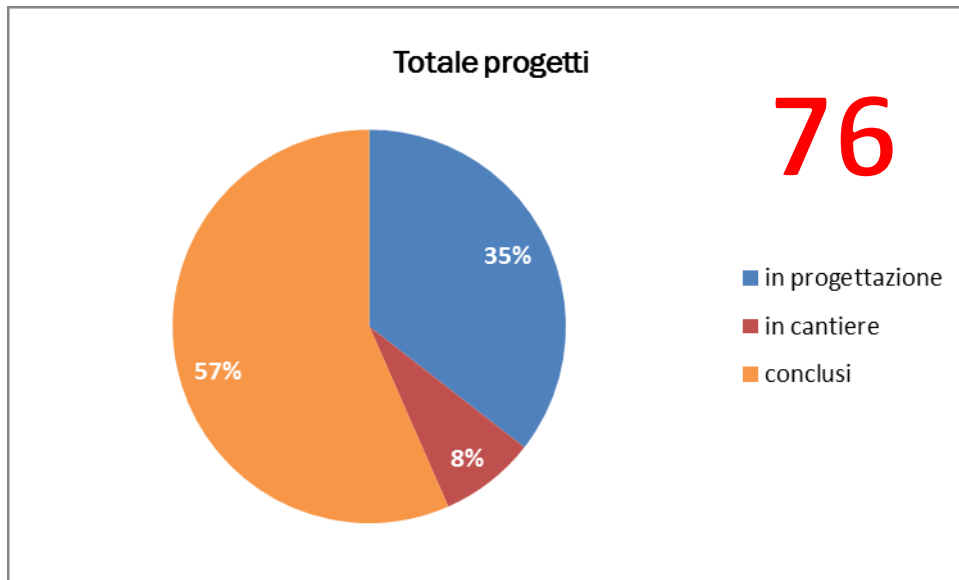

Stato dell'arte progetti		PER UN VALORE PARI A :
in progettazione	27	15.414.902,35
in cantiere	6	3.080.000,00
conclusi	43	15.101.638,97
TOTALE	76	33.596.541,32

AGENDA – SCADENZIARIO

Novità introdotte dalle Ord 13/15 2016

- **30.04.2016** Presentazione SFINGE Imprese (escluse Imprese AGRI)
- **30.06.2016** Presentazione Bando INAIL Imprese
- **30.04.2016** Presentazione MUDE Abitazioni (TUTTE)
- **31.12.2016 (*)** MUDE solo x Abitazioni principali

MUDE Tutti i casi che possono arrivare al **31.12.2016, sono disciplinati secondo disposizioni che regolano i regimi di aiuto per le imprese o per altri aspetti legati alle complessità di alcune unità immobiliari, laddove possano essere presenti funzioni diverse (abitazioni occupate o sfitte, commercio, servizi, studi professionali, eccetera), di proprietà diverse (persone fisiche o imprese), della esistenza o meno di un condominio formalmente costituito, della possibilità di finanziare le imprese con il regime del 'de Minimis'.*

- **30.09.2016** Fine Lavori SFINGE AGRICOLTURA(*)
- **31.12.2016** Rendicontazione SFINGE AGRICOLTURA(*)

** in attesa pronunciamento Commissione UE su ns richiesta di allineamento delle date per tutte le imprese al 2017*

- **31.09.2017** Fine Lavori SFINGE NON agricoltura
- **31.12.2017** Rendicontazione SFINGE NON agricoltura
- **31.12.2017** Fine Lavori Bando Inail
- **30.06.2018** Rendicontazione Bando Inail

L'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012

A dicembre 2012 con la delibera n. 2084 del dicembre 2015 è stata prevista, nell'ambito della più complessiva riorganizzazione della Regione, la costituzione **dell'Agenzia per la ricostruzione sisma 2012**: una struttura dedicata a riassumere le principali funzioni distribuite all'interno delle strutture regionali afferenti la ricostruzione, nonché a coordinare le attività della Struttura tecnica commissariale costituita con l'ordinanza 31/2012.

L'Agenzia è operativa dal **1 aprile 2016**.



FORMAZIONE & INFORMAZIONE

Fase 1: l'Ordinanza e il tema delle Concessioni

2013/2014

SPORTELLO IMPRESE x SFINGE

Mirandola

S.Agostino

Carpi/Novi M

RER

2013: 812 incontri

2014: 382 incontri



2013/2014/2015

INCONTRI IN REGIONE ER

- CASI COMPLESSI -

- 2013: 130 incontri

- 2014: 158 incontri

- 2015: 258 incontri

- 2016*: 43 incontri (al 31/3)

2013/2014/2015

INCONTRI FORMATIVI

REGIONE ER + TERRITORIO

+50



SFINGE, LIQUIDATION DAYS 2015/2016

Fase 2: dalle Concessioni alle Liquidazioni

11 Liquidation Days

TOTALE INCONTRI

ONE TO ONE : 376

19.02.2016

INCONTRO FORMATIVO:
LIQUIDAZIONI STEP BY STEP

20.04.2016

Nuova Ord 57/2012 + Nuovo
Bando Inail

